

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**ZADARSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD ZADAR**  
**Gradonačelnik**  
KLASA: 361-01/20-01/14  
URBROJ: 2198/01-2-20-3  
Zadar, 29. svibnja 2020.

**- GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA -**

**PREDMET:**

**Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2019. godinu**

**NADLEŽNOST:  
ZA DONOŠENJE:**

**GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA**

**PRAVNI TEMELJ:**

**-Zakon o komunalnom gospodarstvu,  
članak 71.**

(„Narodne novine“ br.:68/18, 110/18 i 32/20)

**-Statut Grada Zadra - članak 27.**

(„Glasnik Grada Zadra“ , broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14  
i 2/15-pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst,  
15/19 i 2/20)

**PREDLAGATELJ:**

**Gradonačelnik**

**IZVJESTITELJ:**

**Pročelnik Darko Kasap, dipl.ing.**

**MATERIJAL IZRADIO:**

**Upravni odjel za prostorno uređenje i  
graditeljstvo**

**O b r a z l o ž e n j e**

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2019. godinu odnosi se na izgradnju javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, te groblja. Isti je prihvaćen na 15. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine („Glasnik Grada Zadra“, br.14/18).

I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2019. godinu prihvaćene su na 21. sjednici održanoj dana 19. rujna 2019. godine („Glasnik Grada Zadra“, br.10/19), a II. Izmjene i dopune istoimenog programa prihvaćene su na 23. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine („Glasnik Grada Zadra“, br.15/19).

Na poziciji **javnih površina** od ukupno planiranih 3.400.000,00 kn realizirano je 2.442.529,09 kn što iznosi 71,84% realiziranih sredstava, a odnose se na financiranje Obalnog pojasa Diklo, arheološko istraživanje Trga tri bunara, arheološko istraživanje na Gradskoj tržnici, sufinanciranje 3. faze obalnog zida Jazine, uređenje pločnika uz bedeme na Obali kralja Tomislava i uređenje javne površine u uvali Jazine.

Na poziciji **nerazvrstanih cesta** sredstva su realizirana za 71,67% tj. od ukupno planiranih 12.950.000,00 kn utrošeno je 9.281.878,22 kn.

Na poziciji **javna rasvjeta** od ukupno planiranih 1.600.000,00 kn realizirano je 1.241.369,66 kn što iznosi 77,59% realiziranih sredstava koje su pratile izgradnju cesta.

Na poziciji **izgradnja groblja** sredstava su realizirana za 64,15% tj. od ukupno planiranih 1.600.000,00 kn realizirano je 998.655,70 kn. Realizirana sredstva se odnose na Novo gradsko groblje Grada Zadra.

*Slijedom navedenog dostavlja se Gradskom vijeću ovaj Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2019. godinu – na razmatranje i odlučivanje.*

**GRADONAČELNIK**  
*Branko Dukić, v.r.*

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst, 15/19 i 2/20), **Gradsko vijeće Grada Zadra, na \_\_\_\_ . sjednici, održanoj dana \_\_\_\_\_ 2020. godine, d o n o s i**

## **ZAKLJUČAK**

**1. Prihvća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2019. godinu, koje je u pravitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.**

**2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Grada Zadra“.**

**KLASA: 361-01/20-01/14**  
**URBROJ: 2198/01-1-20-**  
**Zadar, \_\_\_\_\_ 2020. godine**

**GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA**

**PREDSJEDNIK**

*Zvonimir Vrančić, dr.med.*

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br.: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst, 15/19 i 2/20),  
**Gradonačelnik Grada Zadra, Gradskom vijeću Grada Zadra, podnosi**

## **IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2019. godinu**

### **I. - UVOD**

Ovim Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2019. godinu, pokazuje se realizacija izgrađenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a odnose se na:

- 1. JAVNE POVRŠINE**
- 2. NERAZVRSTANE CESTE**
- 3. JAVNU RASVJETU**
- 4. IZGRADNJU GROBLJA**

### **II. - OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

#### **1. JAVNE POVRŠINE**

	<b>PLAN</b>	<b>IZVRŠENJE</b>	<b>%</b>
Obalni pojas Diklo	1.000.000,00	140.917,88	14,09%
Trg Sv. Frane	50.000,00	0	0%
Arheološko istraživanje Trga tri bunara	100.000,00	222.366,73	222,37%
Šetnica Kožino	50.000,00	0	0%
Arheološko istraživanje na Gradskoj tržnici	900.000,00	898.488,60	99,83%
3. faza obalnog zida Jazine	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Uređenje pločnika uz bedeme na Obali kralja Tomislava	100.000,00	70.000,00	70,00%
Uređenje javne površine uvala Jazine	200.000,00	110.755,88	55,38%
<b>UKUPNO</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>2.442.529,09</b>	<b>71,84%</b>

## 2. NERAZVRSTANE CESTE

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Cesta UPU Barbaričine	400.000,00	399.790,90	99,95%
Spojna prometnica između Ulice R.Frangeša -Mihanovića i Ulica Grge Novaka	150.000,00	147.876,92	98,58%
Ulica dr. Franje Tuđmana	50.000,00	0	0,00%
Križanje Ulice Jurja Križanića	600.000,00	670.153,36	111,69%
Put Stanova	3.800.000,00	3.839.823,17	101,05%
Spoj Molatske ulice sa Skradinskom ulicom (Riječka ulica) - nastavak	1.300.000,00	1.300.664,95	100,05%
Rekonstrukcija dijela Ulice Nikole Tesle	2.000.000,00	2.032.489,93	101,62%
Nerazvrstane ceste u Gornjem Diklu	300.000,00	0	0,00%
Križanje Ulice Hrvatskog sabora i Puta Biliga	600.000,00	0	0,00%
Križanje Ulice braće Miroslava i Janka Perice (Biogradska cesta) i Gaženička cesta	500.000,00	0	0,00%
Cesta pored Centra Mocire	100.000,00	0	0,00%
Odvojak Ulice Mile Gojsalić	100.000,00	0	0,00%
Novi odvojak Ulice Franje Fanceva	50.000,00	0	0,00%
Ceste u obuhvatu UPU-a Karma	50.000,00	0	0,00%
Kijevska ulica – nastavak	50.000,00	0	0,00%
Spoj Ulice Gospe maslinske i Lazaretske ulice	50.000,00	0	0,00%
Pristupna cesta i parkiralište u Petrčanima	100.000,00	0	0,00%
Nova pristupna cesta prema Puntiradman	500.000,00	532.750,99	106,55%
Spojna cesta Ulice Miroslava Krleže i Obale kneza Trpimira	50.000,00	0	0,00%
Pristupna cesta NGGZ	400.000,00	0	0,00%
Pristupna cesta GZ Crno 1. faza	400.000,00	0	0,00%
Izgradnja nogostupa u Ulici biskupa Jurja Dobrile	350.000,00	346.453,00	98,99%
Pristupna cesta na Put Murvice	600.000,00	11.875,00	1,98%
Rekonstrukcija Ulice Nikole Tesle 2. faza	100.000,00	0	0,00%
Uređenje dijela Ulice Maka Dizdara	200.000,00	0	0,00%
Cesta UPU-a Vidikovac – 2. i 4. faza	200.000,00	0	0,00%
<b>UKUPNO</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>9.281.878,22</b>	<b>71,67%</b>

### 3. JAVNA RASVJETA

	PLAN	IZVRŠENJE	%
Put Stanova	550.000,00	525.435,26	95,53%
Spoj Molatske sa Skradinskom ulicom (Riječka ulica) - nastavak	300.000,00	282.447,25	94,15%
Rekonstrukcija dijela Ulice Nikole Tesle	400.000,00	390.823,59	97,71%
Nerazvrstane ceste u Gornjem Diklu	50.000,00	0	0,00%
Cesta pored Centra Mocire	100.000,00	0	0,00%
Nova pristupna cesta prema Puntić Radman	100.000,00	42.663,56	42,66%
Pristupna cesta na Put Murvice	100.000,00	0	0,00%
<b>UKUPNO</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.241.369,66</b>	<b>77,59%</b>

### 4. IZGRADNJA GROBLJA


	PLAN	IZVRŠENJE	%
Novo Gradsko groblje Grada Zadra	1.300.000,00	998.655,70	76,82%
Postojeće Gradsko groblje Zadar	300.000,00	0,00	0,00%
<b>UKUPNO</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>998.655,70</b>	<b>62,42%</b>

### REKAPITULACIJA

	PLAN	IZVRŠENJE	%
<b>JAVNE POVRŠINE</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>2.442.529,09</b>	<b>71,84%</b>
<b>NERAZVRSTANE CESTE</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>9.281.878,22</b>	<b>71,67%</b>
<b>JAVNA RASVJETA</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.241.369,66</b>	<b>77,59%</b>
<b>IZGRADNJA GROBLJA</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>998.655,70</b>	<b>62,42%</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>19.550.000,00</b>	<b>13.964.432,67</b>	<b>71,43%</b>

Grafički prikaz izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2019. godinu

	PLAN	IZVRŠENJE	%
JAVNE POVRŠINE	3.400.000,00	2.442.529,09	17,49%
NERAZVRSTANE CESTE	12.950.000,00	9.281.878,22	66,47%
JAVNA RASVJETA	1.600.000,00	1.241.369,66	8,89%
IZGRADNJA GROBLJA	1.600.000,00	998.655,70	7,15%
UKUPNO	19.550.000,00	13.964.432,67	100,00%

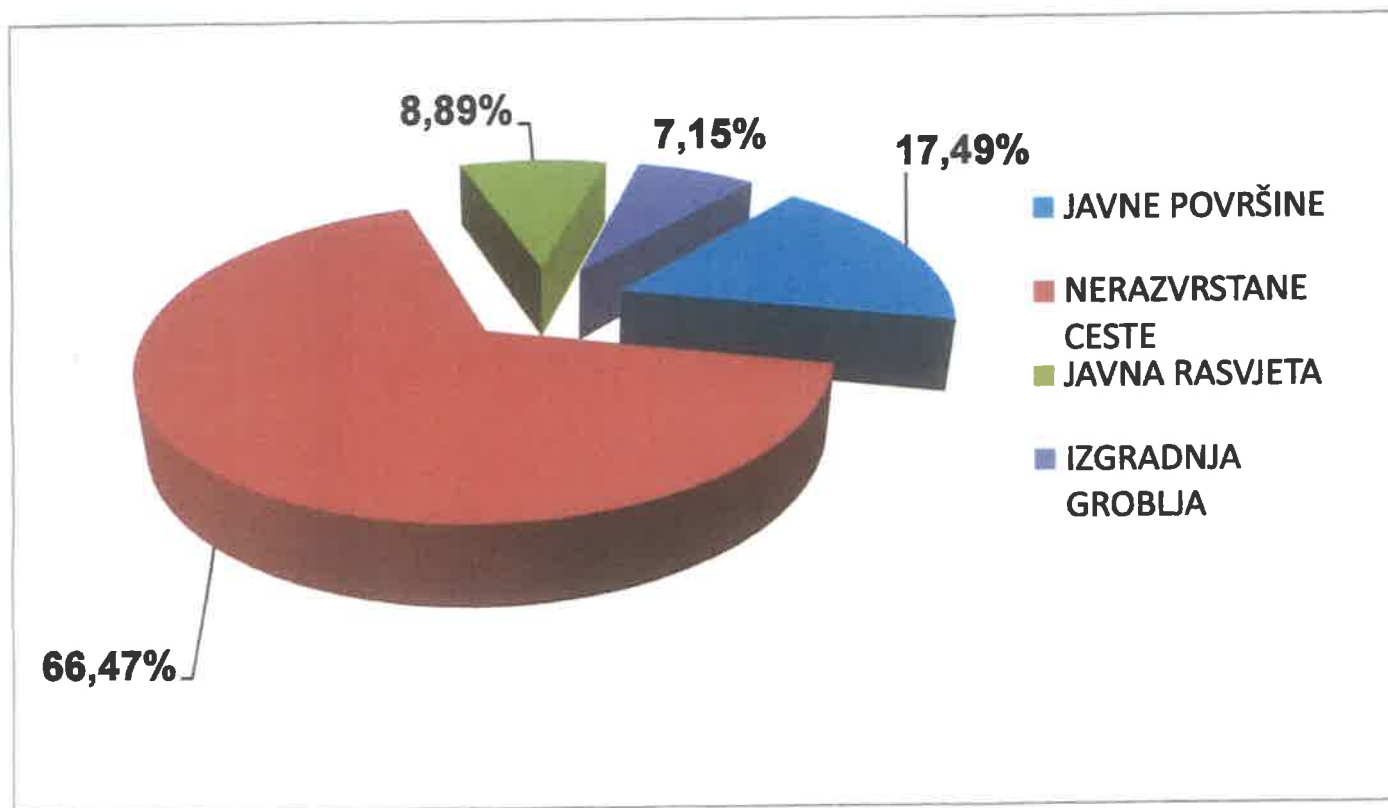

Grafički prikaz izvršenja Proračuna Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo za 2019. godinu

	PLAN	IZVRŠENJE	%
IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	19.550.000,00	13.964.432,67	71,43%
PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	7.200.000,00	4.258.163,18	59,14%
PRIPREMA ZEMLJIŠTA I IZRADA PROSTORNO-PLANSKIH DOKUMENATA	19.700.000,00	17.452.639,79	88,59%
PROGRAM OBNOVE SPOMENIKA KULTURE	50.000,00	0,00	0,00%
PROGRAMI U SLUŽBI ZAŠTITE OKOLIŠA	24.875,00	24.875,00	100%
PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	4.006.811,02	3.425.802,66	85,50%
IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA	18.133.126,91	17.033.152,50	93,93%
UKUPNO	68.664.812,93	56.159.065,80	81,79%

